工事のお知らせ　～南本牧外周H－1及びH－2護岸際からの揚土作業について～

工事概要

本工事は、大黒ふ頭中継所及び幸浦中継所に仮置きされた建設発生土を密閉式土運船と押船により、南本牧埋立地まで運搬して、第4-4ブロック外周H-1及びH-2護岸からリクレーマ船により揚土、埋立を行うものです。

工事名称　：南本牧埋立事業 中継所土砂海上運搬及び揚土等工事（29-2）
発 注 者　：横浜港埠頭株式会社技術部　建設発生土受入事業課
　　ＴＥＬ：０４５－６７１－０５００　　監督員：秋元　規由
工事場所　：神奈川県横浜市中区南本牧地先　南本牧埋立地区
契約工期　：平成２９年　９月１４日 ～ 平成３０年　３月３０日
作業期間　：平成２９年１１月　１日 ～ 平成３０年　３月３０日
作業時間　：日の出～日没　（作業終了後、作業船は同一場所で停泊します。）

概略工程表

工　種	単位	数量	平成29年 10月 10	10月 20	10月 31	11月 10	11月 20	11月 30	12月 10	12月 20	12月 31	平成30年 1月 10	1月 20	1月 31	2月 10	2月 20	2月 28	3月 10	3月 20	3月 31
準備工・後片付工	式	1	■	■	■															■
土砂海上運搬工	m3	350,000				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
土砂揚土工	m3	350,000				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
土工	m3	88,000				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※各中継所の土砂仮置状況により、揚土数量・日数の増減が生じます。

施工位置図

標　識　旗

作業船には、『南本牧ふ頭』の標識旗を揚げます。

作業船配置例

※下記状況図はリクレーマ船配置例です。揚土作業は、リクレーマ船１隻のみで行います。

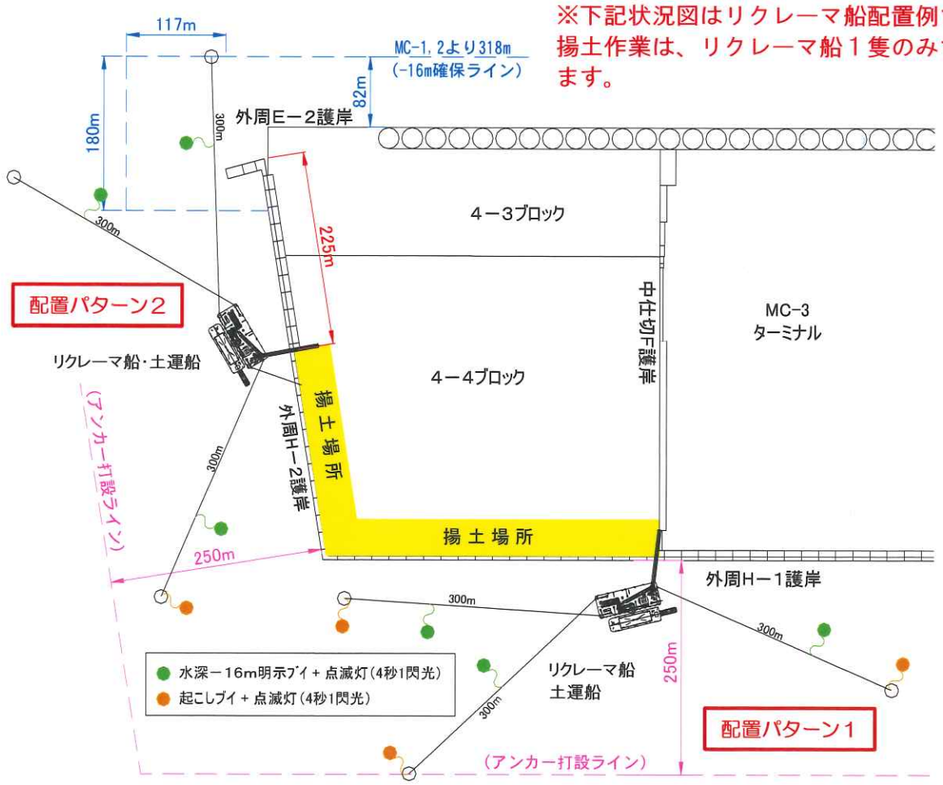

夜間停泊状況例

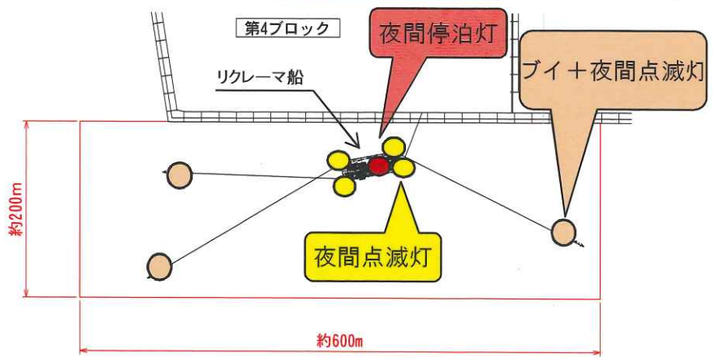

◎夜間点滅灯（黄色４秒１閃灯）
◎アンカーワイヤーを夜間照射

リクレーマ船

◎バックホウ式揚土船
船体寸法：７３ｍ×２６ｍ×４．３ｍ

東亜・松浦建設企業体
住所　：横浜市中区本牧埠頭１番地
TEL　：045-622-5231　FAX　：045-622-9691
現場代理人 兼 監理技術者　：三浦　剛史
主任技術者　：富岡　直也
